



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Aktuālā patvertņu projektu progresa informācija

22.07.2026.



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



SAM 5.2.1.1.

“Objektu (patvertņu) pielāgošana un
aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”

Agate Streipa

Teritoriju infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vadītāja

Kopsavilkums: progress un galvenie secinājumi

 **64**

apstiprināti projekti

 **509**

objekti / patvertnes

 **0,18%**

faktiskais ERAF izlietojums

37 063,23 EUR bez avansiem

 **28**

projekti ar riskiem

aptaujā norādīti būtiski kavējumi

GALVENĀ ZIŅA

Līgumi par projekta īstenošanu noslēgti, tomēr faktiskais finansējuma izlietojums joprojām ir ļoti zems.

Līdz 31.12.2026. PMPIG prognoze rāda pieaugumu līdz aptuveni 18,73%, ja iepirkumu un būvdarbu grafiki īstenojas bez papildu nobīdēm.

RISKI / IZAICINĀJUMI


Iepirkumu procedūru kavēšanās, atkārtoti iepirkumi un piedāvājumu sadārdzinājums.

Vienotu prasību un aprīkojuma specifikāciju trūkums, īpaši VUGD vadlīniju un ventilācijas risinājumu piemērošanā.

Nepietiekama kapacitāte FS iepirkumu nodaļās un laikietilpīga tehnisko specifikāciju sagatavošana.

VADĪBAS FOKUSS: paātrināt iepirkumu sagatavošanu, vienādot aprīkojuma prasības / EIS pieejamību un savlaicīgi vadīt sadārdzinājuma riskus.

Projektu un objektu sadalījums pa reģioniem

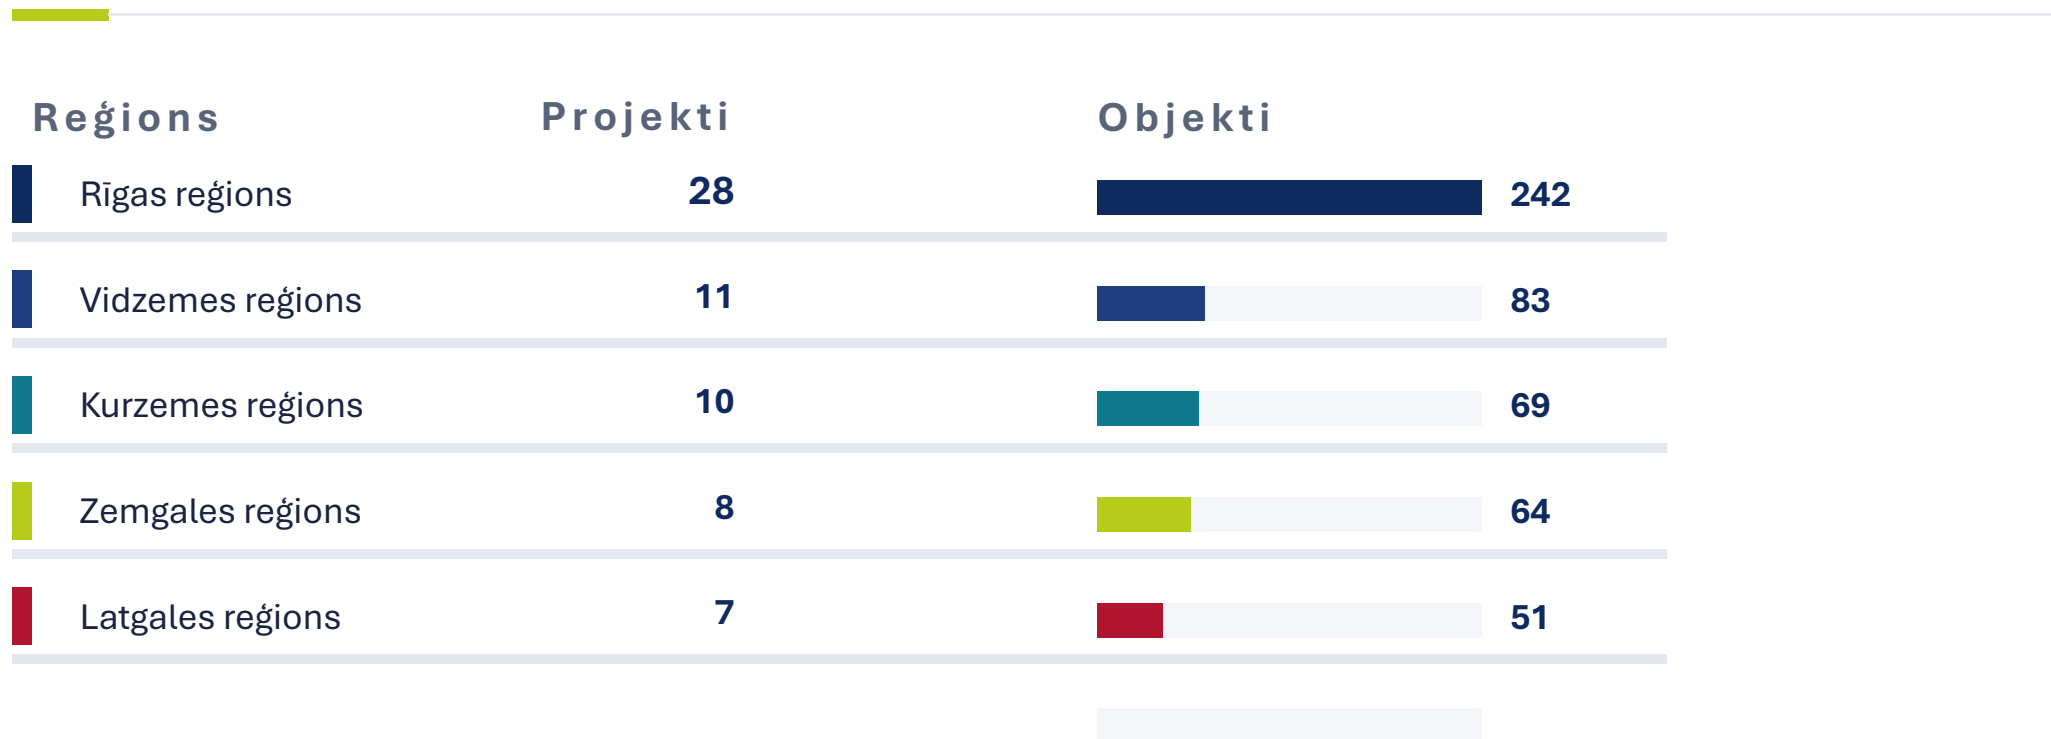

FAKTISKAIS STATUSS

Pabeigtie projekti un tuvākā progresā prognoze

1

pabeigts projekts

VSIA "Slimnīca
Ģintermuiža"

1

pabeigts objekts

III kategorijas patvertne

23 445,48 €

izmaksāts ERAF

par faktiski izpildītiem
darbiem, projektā
ietaupījums



PIEMĒRS

Ģintermuiža

Nelieli pielāgošanas darbi un aprīkojuma iegāde īstenoti ātrāk nekā
plānots; noslēguma maksājuma pieprasījums iesniegts 30.03.2026.

PROGNOZĒTAIS PROGRESS

ERAF apguves attīstība trīs kontrolpunktos

Tagad
22.07.2026.

0,18%

1 proj. · 1 obj. · 37 063 EUR

Prognoze
31.08.2026.

2,0%

5 proj. · 11 obj. · 390 877 EUR

Prognoze
31.12.2026.

18,73%

11 proj. · 36 obj. · 3 669 207 EUR

Īstenošanā esošie projekti: statusi un termiņi

IEVIEŠANAS PORTFELIS

63 projekti ir līguma statusā, bet iepirkumu process ir nevienmērīgs — liela daļa vēl ir plānošanas vai sagatavošanas stadijā.



	Plānots / sagatavošanā	29
	Izsludināts / izvērtēšanā	16
	Procesā / līgumu slēgšana	14
	Pabeigti iepirkumi / gatavs	2
	Nav klasificēts	3

PLĀNOTIE PROJEKTA BEIGU TERMIŅI



⚠ GALVENIE TERMIŅU RISKI

Pārtraukti vai atkārtoti iepirkumi projektēšanai, būvdarbiem un aprīkojumam.

Būvdarbu sezonālitate un objektu pielāgošanas ierobežojumi, īpaši izglītības un ārstniecības iestādēs.

Secinājumi un ieteikumi



Projektu īstenošana ir uzsākta, bet finansējuma izlietojums vēl neatbilst intensīvai ieviešanai.

Faktiskā apguve 0,18%; līdz gada beigām prognoze 18,73%.



Kavējumu pamata cēlonis ir iepirkumu un tehnisko prasību kombinācija.

Atkārtoti iepirkumi un sadārdzinājums, prasību interpretācija.



Nepieciešamā aprīkojuma specifikāciju un pieejamības jautājums.

Ieteicamā aprīkojuma katalogs III kategorijas patvertnēm:
<https://www.vugd.gov.lv/lv/ieteicama-aprikojuma-katalogs-iii-kategorijas-patvertnem>



Patvertņu pieklūstamības vadlīnijas

Piemērojamas ciktāl tas ir tehniski, funkcionāli un ekonomiski iespējams:

<https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-par-minimalajam-prasibam-telpu-pielagosanai-iii-kategorijas-patvertnes-izveidosanai>

MĒRĶIS NĀKAMAJAM POSMAM

no projektu "sagatavošanas" posma pāriet uz mērķtiecīgu būvdarbu / aprīkojuma izpildi un maksājumu pieprasījumu iesniegšanu.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

PALDIES!

Jautājumi un diskusijas

Saziņai ar CFLA



TĪMEKĻA VIETNE
www.cfla.gov.lv



E-PASTS
cfla@cfla.gov.lv



TĀLRUNIS
+371 66939777



ADRESE
Smilšu iela 1, Rīga, Latvija



FACEBOOK
[@CFLA.gov.lv](https://www.facebook.com/CFLA.gov.lv)



X
[@CFLA_gov_lv](https://twitter.com/CFLA_gov_lv)



YOUTUBE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
